

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 643/DJPSDKP.2/TU.140/VIII/2026

Yth : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana
Pengawasan Bulan Juli 2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

Sehubungan dengan kegiatan dan anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2026, bersama ini terlampir kami sampaikan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Bulan Juli 2026.

Demikian disampaikan, atas petunjuk dan arahan lebih lanjut dari Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.


Sunaryo

Ditandatangani
Secara Elektronik

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen PSDKP
2. Direktur lingkup Ditjen PSDKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

OCEAN
IMPACT
SUMMIT

KKP
2023

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA

Juli 2026



DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK



Realisasi Anggaran

Periode Juli 2026



Pagu Efektif

Rp1.115.274.296.000

100%



Realisasi Anggaran

SP2D

Rp1.181.604.614

0,11%




Sisa Pagu Anggaran

Rp1.114.092.691.386

99,89%




Realisasi Anggaran (%)

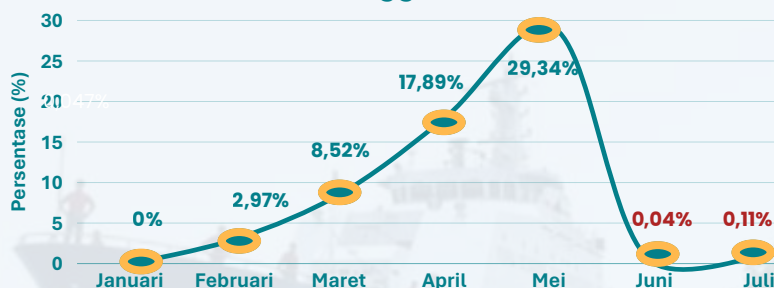

Realisasi anggaran pada bulan Juli 2026 mengalami kenaikan menjadi 0,11%. Dit. PSP mendapatkan Anggaran Biaya Tambahan pada kegiatan Pokmaswas sebesar Rp.2,5 Milyar

Realisasi Anggaran (Rupiah)

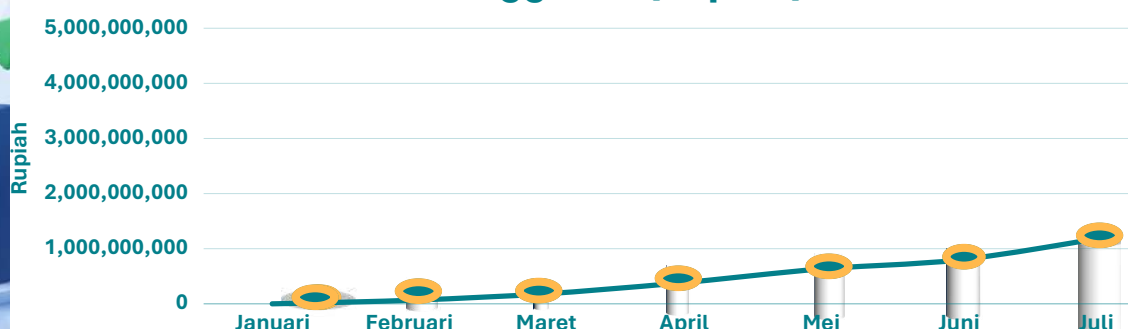

#PSPSICAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Pembangunan Kapal Pengawas 70 Meter



Progres Konstruksi



Steel Cutting Kapal 509 dan 510

- Kapal ke-1 dan ke-2 (507 dan 508) dalam proses pembahasan sistem permesinan kapal;
- Pembahasan optimalisasi desain *landing drone pad*;
- *Cutting steel* Kapal ke 3 dan ke 4 (509 dan 510) tanggal 17 Juli 2026, dilanjutkan tahapan *assembly block* untuk *keel laying*.

Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Pembangunan Kapal Pengawas 70 Meter



Reviu Pembayaran Pekerjaan MFISS

- Inspektorat II melakukan reviu pembayaran *steel cutting* dan *keel laying* tanggal 20 - 24 Juli 2026;
- Untuk memastikan progres pekerjaan dilakukan diskusi dengan Gondan Astilleros pada tanggal 24 Juli 2026;
- Dilakukn *sharing session* proses pembangunan kapal dengan PT. Tesco Indo Maritim tanggal 29 Juli 2026;
- Inspektorat II menyampaikan Surat Hasil Reviu (SHR) pada tanggal 29 Juli 2026.



Koordinasi Pembayaran Pekerjaan MFISS



- Pengajuan Surat Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPDPL) tanggal 30 Juli 2026;
- KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan *disbursement instruction* dan *withdrawl application* tanggal 30 Juli 2026.



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2ES) Badan Standar dan Sertifikasi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Pembangunan Kapal Pengawas 61 Meter



Steel Cutting



- Kegiatan *Steel Cutting* dilaksanakan di Galangan PT Bandar Abadi, Batam tanggal 31 Juli 2026;
- Kegiatan dipimpin oleh Staf Khusus MKP Bidang PSDKP, dihadiri Inspektur II, Direktur PSP, Direktur PT. Famindo Inovasi teknologi, Direktur utama PT. Bandar Abadi, Direktur JDC sebagai Konsultan Pengawas, *Chief Representative* Llyod's Register, dan Kepala Pangkalan PSDKP Batam.

Pelaksanaan *steel cutting* terhadap 6 (enam) Unit Kapal Pengawas 61 Meter (Hull No. H-479 s.d. H-484) telah diselesaikan, dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan *Steel Cutting* dan sertifikat *Steel Cutting* yang diterbitkan oleh Lloyd's Register Indonesia



Staf Khusus MKP Bidang PSDKP menekankan:

- Pelaksanaan pembangunan kapal pengawas dilakukan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta transparansi guna memenuhi prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya;
- Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan pekerjaan;
- PT. Bandar Abadi harus membuat manajemen proyek yang terintegrasi dari setiap divisi, sehingga mampu mengendalikan dan mitigasi risiko yang terjadi sejak awal;
- Pendampingan dan pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP untuk memastikan seluruh proses pembangunan sesuai dengan Kontrak.

#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2ES) Badan Standar Nasional



orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Peningkatan Kapasitas Dermaga Kapal Pengawas



Groundbreaking



- Tanggal 6 Juli 2026 oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan didampingi oleh Dirjen PSDKP, Dirjen Perikanan Tangkap, Staf Khusus MKP Bidang PSDKP;
- PPK, Pelaksana Pekerjaan, dan Pengawas Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, tepat waktu, dan standar mutu serta keselamatan konstruksi yang berlaku.

Progres Pekerjaan s.d 31 Juli 2026

- Berdasarkan kurva S, target mingguan 4,33% (kumulatif rencana 18,79%), realisasi mingguan 1,28% (kumulatif aktual 21,01%);
- Progres pemancangan tiang pancang sebanyak 6 titik, kendala disebabkan terdapat satu titik SP02-P3 mengalami kemiringan diperlukan alat tambahan leader, yang tiba 28 Juli 2026;
- Kelengkapan K3 telah tersedia;
- Uji trial mix telah dilaksanakan 17 Juli 2026;
- Uji tarik/tekuk besi tulangan telah dilaksanakan 6 dari 8 kali;
- Kelistrikan untuk pekerjaan telah selesai dipasang;
- Penambahan daya untuk listrik darat menunggu RAB dari PLN Batuaji;
- Sedimentasi hasil pembersihan alur direncanakan akan ditempatkan di lahan samping DTC;
- Penyambungan kabel ± 760 m ke dermaga sementara telah selesai.



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2E) Badan Standar Nasional

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Peningkatan Kapasitas Dermaga Kapal Pengawas



Pengendalian

- Mekanisme pelaporan harian disampaikan via WA grup, pelaporan mingguan dimulai 7-13 Juli 2026 dan dirapatkan setiap hari Rabu;
- Rapat *on site* dilaksanakan 7 Juli 2026, *weekly meeting* dilaksanakan 15, 22 dan 29 Juli 2026;
- Pelaporan oleh MK berupa laporan pendahuluan, laporan mingguan ke 1 s.d ke 5;
- Jumlah pekerja, alat akomodasi dan kartu identitas dilaporkan ke Pangkalan PSDKP Batam;
- Jam kerja pemancangan sampai pukul 17.30 WIB, sedangkan pertukangan sampai pukul 22.00 WIB.



Proses Pengurusan Dokumen KKPRL di BP Batam

Dokumen KKPRL terbagi menjadi dua, yaitu:

- Wilayah perairan depan Dermaga Pangkalan PSDKP Batam, mempergunakan dokumen PKKPRL yang diterbitkan KKP Tahun 2023;
- Wilayah perairan seluas +/- 4.000 m² disamping Dermaga, pemanfaatan oleh PT Batam Nara, telah dilakukan survei lokasi dan dalam proses penilaian teknis oleh Badan Pengusahaan Batam.



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2E) Badan Standar dan Sertifikasi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



- 



Perencanaan Kebutuhan dan Pengendalian Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengawasan

Pengembangan SIRIP (Sistem Informasi Rencana Induk dan Pelaksanaan) PSP



Progres Pekerjaan



Telah dilakukan familiarisasi, uji coba dan penyempurnaan aplikasi melibatkan Tim pusat dan UPT Ditjen PSDKP

TAHAPAN PENGEMBANGAN SIRIP-PSP



FITUR UTAMA SIRIP-PSP



OUTPUT YANG TELAH DIHASILKAN

- ✓ Sistem Informasi SIRIP-PSP telah selesai dikembangkan.
- ✓ Master Database PSP tersedia.
- ✓ Dashboard monitoring prasarana dan sarana pengawasan tersedia.
- ✓ Form monitoring kondisi prasarana-bangunan tersedia.
- ✓ Form kondisi sarana-Kapal Pengawas tersedia.
- ✓ Form perencanaan pengembangan tersedia.
- ✓ Familiarisasi kepada 21 unit kerja ditjen PSDKP telah dilaksanakan pada 16 Juli 2026.
- ✓ Uji coba database telah dilaksanakan.
- ✓ Masukan pengguna telah diakomodasi sebagai penyempurnaan sistem.

KEGIATAN FAMILIARISASI SIRIP-PSP 16 JULI 2026



Kegiatan familiarisasi dan uji coba database SIRIP-PSP bersama perwakilan 21 unit kerja di lingkungan Ditjen PSDKP.

#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2ES) Badan Standar Nasional

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Jujur, Berkompetensi, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Supervisi, Penyediaan dan Kesiapan Prasarana Pengawasan

Supervisi dan Perencanaan Pembangunan Kantor



Supervisi Pembangunan Kantor Lanjutan Satwas PSDKP Padang



Progres pembangunan lanjutan Kantor Satwas SDKP Padang per 31 Juli 2026 sebesar 43,71% berupa pekerjaan acian dinding dan kolom lantai 2, pasangan dan pengecatan partisi dan dinding lantai 2, pasangan plafond PVC, granite selasar, rangka plat cutting dan pekerjaan kanopi teras

Supervisi Penyediaan Kantor Satwas PSDKP Tegal



Pembuatan RAB dan gambar perencanaan telah selesai dan dalam tahap revisi setelah pembahasan reuiu oleh Tim Dit. PSP

Supervisi Penyediaan Prasarana Kantor Pangkalan PSDKP Benoa



Pembuatan RAB dan gambar perencanaan telah selesai dan dalam tahap revisi setelah pembahasan reuiu oleh Tim Dit. PSP



Supervisi, Penyediaan dan Kesiapan Prasarana Pengawasan

Rencana Supervisi Kesiapan Prasarana UPT di Triwulan III



Nilai kesiapan prasarana UPT PSDKP di TW 3 Tahun 2026 di rencanakan di Stasiun PSDKP Ambon, Pangkalan PSDKP Benoa, Stasiun PSDKP Pontianak dan Pangkalan PSDKP Bitung

Hibah dan Pemanfaatan Lahan

Hibah lahan Satwas SDKP Kotabaru



Proses hibah lahan Satwas SDKP Kotabaru seluas 5.887 m² Pendaftaran dan penerbitan sertifikat an. Pemerintah RI c.q KKP pada proses melengkapi ulang dokumen untuk dilakukan penelitian berkas

Hibah lahan Satwas PSDKP Tumumpa

1. Progres hibah lahan dan bangunan Pelabuhan Perikanan Tumumpa, seluas 247,5 m²;
2. BAST dan NPHD telah di reviu oleh Biro Keuangan dan BMN KKP dan disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov Sulut;
3. Berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulut:
 - Surat Keputusan Gubernur Prov. Sulut Bersedia Menghibahkan, saat ini berproses di Sekda;
 - Draf NPHD dan BAST berproses di Badan Keuangan dan Aset Prov. Sulut.



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2E) Badan Standar dan Sanksi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Penguatan Kebijakan dan Supervisi Pembinaan Pokmaswas

Supervisi Pembinaan Pokmaswas




Pembinaan Pokmaswas

1. Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pokmaswas di Kabupaten Deli Serdang Pokmaswas Wahana Samudera dan masyarakat nelayan Desa Percut Sei Tuan tanggal 8 juli 2026 ;

2. Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pokmaswas di Kepulauan Seribu dan Pulau Tidung bersama Dinas KPKP DKI Jakarta tanggal 14 sd 15 Juli 2026;

3. Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pokmaswas di Dinas KPKP DKI Jakarta tanggal 22 Juli 2026.

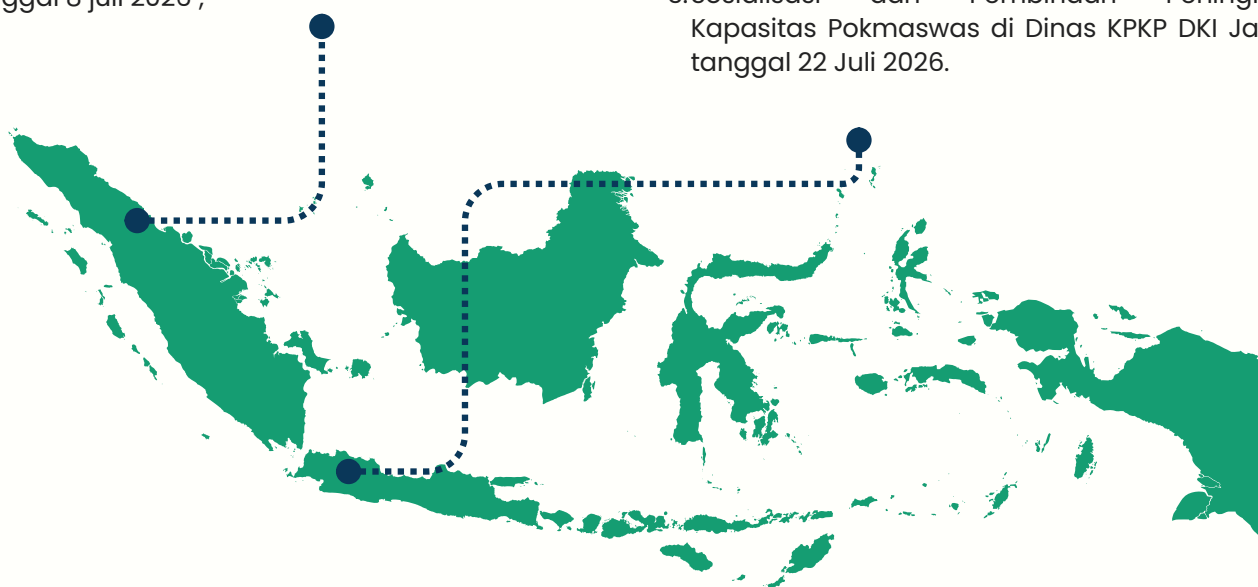

Penguatan Kebijakan dan Supervisi Pembinaan Pokmaswas

Perubahan Kepmen KP No.58 Tahun 2001



30 Jul 2026 10.23.52
8888 Gang Pelikan

Pendalaman Substansi Rancangan Permen KP

- Mekanisme pembentukan Pokmaswas dalam RPermen perlu diselaraskan dengan ketentuan Permen KP Nomor 28 Tahun 2024;
- Pengaturan pembentukan kelompok mengacu pada Permen KP Nomor 28 Tahun 2024, sedangkan aspek penetapan, registrasi, pembinaan, dan pelaksanaan tugas Pokmaswas tetap diatur dalam RPermen;
- Definisi, kedudukan, dan struktur organisasi Pokmaswas dalam RPermen perlu diselaraskan dengan Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 agar tercipta keseragaman pemahaman dan implementasi kelembagaan di lingkungan KKP.



Konsultasi Publik

- Kegiatan dilaksanakan tanggal 30 Juli 2026 di PPN Kejawatanan, dihadiri Sekretaris Itjen, 35 Pokmaswas Kabupaten/Kota Cirebon, perwakilan Eselon I KKP, Pangkalan PSDKP Jakarta, PPN Kejawatanan, Setditjen PSDKP, dan Dit. PSP;
- Beberapa masukan, antara lain: perlunya penguatan perlindungan hukum bagi Pokmaswas dalam menjalankan tugasnya, peningkatan dukungan anggaran Pokmaswas, penyediaan media pengaduan yang mudah diakses, serta dukungan prasarana dan sarana bagi Pokmaswas;
- Tahap selanjutnya adalah Harmonisasi Rancangan PerMen KP dengan Kementerian Hukum pada Minggu ke II Agustus 2026.



#PSPSIGAP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2E) Badan Standar dan Sertifikasi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Penyusunan Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Tahun 2026

Pembahasan Penyusunan Dokumen PBG dan SLF Tahun 2026



LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	PROGRES PEKERJAAN	UPDATE PER 31 JULI 2026
 Satwas Belitung	41.000.000	 Reviu —  Reviu Selesai —  Proses PBJ —  Tandatangani Kontrak —  Proses Pekerjaan	 Sudah tanda tangan kontrak dan proses pekerjaan
 Satwas Ternate dan Satwas Morotai	78.200.000	 Reviu —  Reviu Selesai —  Proses PBJ —  Tandatangani Kontrak —  Proses Pekerjaan	 Sudah tanda tangan kontrak dan proses pekerjaan
 Satwas Halmahera Selatan	60.940.000	 Reviu —  Reviu Selesai —  Proses PBJ —  Tandatangani Kontrak —  Proses Pekerjaan	 Sudah tanda tangan kontrak dan proses pekerjaan
 Satwas Ambon dan Wilker Banda	48.840.000	 Reviu —  Reviu Selesai —  Proses PBJ —  Tandatangani Kontrak —  Proses Pekerjaan	 Sudah tanda tangan kontrak dan proses pekerjaan

#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2ES) Badan Standar Nasional


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Dukungan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan

Kerja sama dengan JICA dan GIZ



Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Kerja Sama JICA

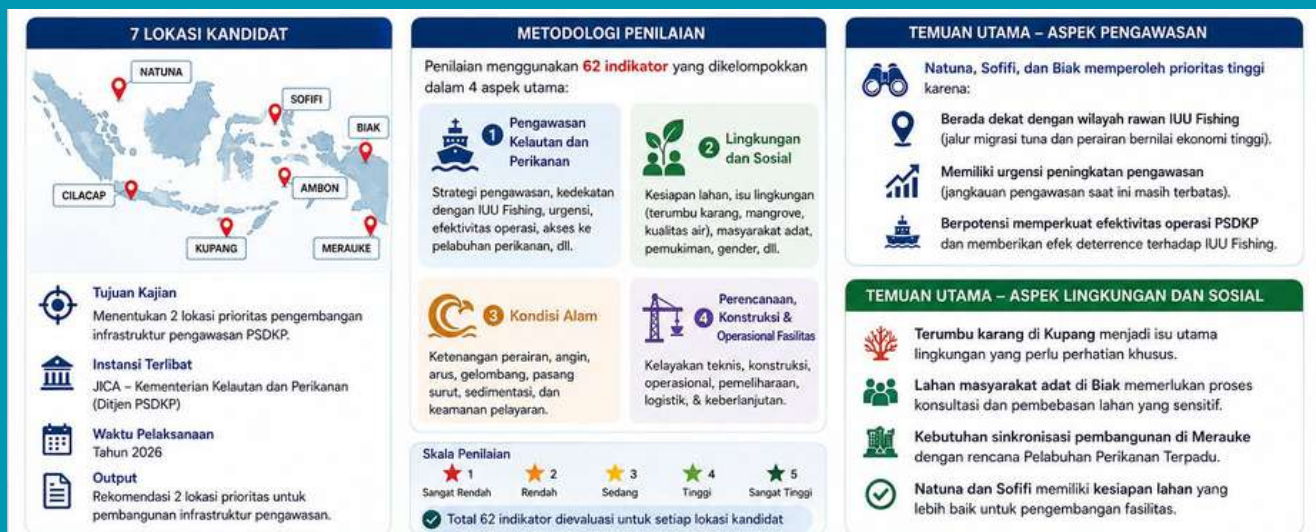

Koordinasi Rencana Kegiatan Pokmaswas bersama GIZ



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2ES) Badan Standar Nasional

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi Dit. PSP

1

DISTRIBUSI
PAGU INDIKATIF 2027
DIT. PSP

862.114.000.000

2

PENGUSULAN ALOKASI
ANGGARAN BERSUMBER
PNBP (2027-2029)

121.889.000.000

3

ALOKASI ABT
POKMASWAS 2026

2.500.000.000

4

PENILAIAN MANDIRI
SAKIP

88,50

DENGAN KATEGORI

A

5

NILAI KERJA ORGANISASI
DIREKTORAT PRASARANA
DAN SARANA PENGAWASAN

108,18%

DENGAN KATEGORI

BAIK

6

SASARAN KINERJA
PEGAWAI DENGAN
JUMLAH 30 ORANG
TELAH DISELESAIKAN

DENGAN KATEGORI

KESELURUHAN BAIK

7

IP ASN MENDAPAT
NILAI

88,39

KATEGORI

TINGGI

8

HASIL PENILAIAN
MANAJEMEN RISIKO
UNTUK 13 PENGENDALIAN
RISIKO

100%

PSP KUAT - PSDKP TANGGUH

#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2ES) Badan Standar Nasional

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN
